


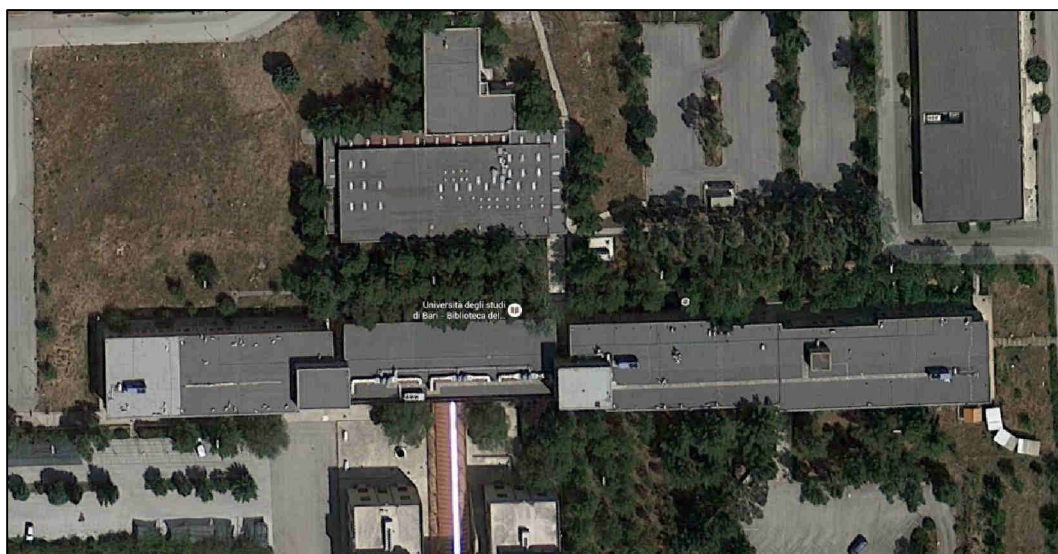

EDIFICIO SEDE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA (CORPI A-B-C)
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO (COPERTURE - FACCIATE - INFISSI),
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE INTERNA E PENSILINE
FOTOVOLTAICHE SUI PARCHEGGI DEL COMPLESSO EDILIZIO DEI DIPARTIMENTI DI
MEDICINA VETERINARIA IN VALENZANO (BA)

PROGETTO DEFINITIVO - LUGLIO 2015

G10

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. GAETANO RANIERI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE DEL PROGETTO

ING. GIUDITTA BONSEGNA

PROGETTISTI

GEOM. VITO ANTONACCI
PER. IND. DOMENICO CASSANO
GEOM. ANTONIO COTENA
GEOM. CARLO GIOIA
ING. GIUSEPPE DELVECCHIO
GEOM. ROCCO MANGIALARDI
GEOM. GIUSEPPE MARZANO
GEOM. NICOLA PIACENTE
ING. ANDREA TROVATO

**COORDINATORE SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE**

ING. GIUDITTA BONSEGNA

ALLEGATO "A"

Comune di Bari
Provincia di BA

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Opere di riqualificazione energetica dell'involucro, efficientamento dell'impianto elettrico di illuminazione interna e pensiline fotovoltaiche sui parcheggi del complesso edilizio dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria

COMMITTENTE: Università degli Studi di Bari

CANTIERE: S.P. 63 Valenzano-Casamassima km 3, Bari (BA)

Bari, lì Luglio 2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Bonsegna Giuditta)

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Ranieri Ing. Gaetano)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

Ingegnere Bonsegna Giuditta
P.zza Umberto I, 1
70121 Bari (BA)
0805714597 - 0805714655
giuditta.bonsegna@uniba.it

Nome attività	Durata	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE OPERE EDILI IN FACCIATA	8 g												
Realizzazione allestimento cantiere	2 g												
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g												
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g												
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g												
DEMOLIZIONI	31 g												
Rimozione di cls CORPO AULE	21 g												
Rimozione di impianti CORPO AULE	10 g												
LAVORI EDILI	66 g												
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	17 g												
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	30 g												
Rimozione di serramenti esterni	27 g												
Posa di serramenti esterni	10 g												
Tinteggiatura di superfici esterne	9 g												
Applicazione coibentazione di coperture	7 g												
SMOBILIZZO DEL CANTIERE OPERE EDILI	3 g												
Smobilizzo del cantiere	3 g												
IMPIANTI ELETTRICI	122 g												
Rimozione di impianti elettrici	68 g												

Nome attività	Durata	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Sostituzione corpi illuminanti interni	82 g												
Montaggio di apparecchi illuminanti su pali per pubblica illum	10 g												
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	6 g												
Realizzazione allestimento cantiere	1 g												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g												
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g												
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	37 g												
Posa di conduttura elettrica interrata	4 g												
Posa di pensiline per posizionamento pannelli fotovoltaici	15 g												
Posa di impianto fotovoltaico	17 g												
SMOBILIZZO DEL CANTIERE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	3 g												
Smobilizzo del cantiere	3 g												
