Accordo quadro di 3 anni per la riqualificazione e ammodernamento di aule e spazi didattici comprensivo di fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili e apparati audio-video del Policlinico di Bari.

AGGIORNAMENTO 19/02/2024

DATA CONSEGNA LAVORI 07/12/2023

Ordini	Codice	AULE	N	Posti	Giorni	*Arredi*	*Attrezz.*	*Lavori*	*TOT.*
						650,00 €	40 000,00 €	1 000,00 €	
A		CLINICHE ODONTOIATRICHE	3	198	118,8	127 638,13 €	118 368,00 €	13 978,71 €	259 984,84 €
	21_1	*Aula A*		62	37,2				
	21_2	*Aula B*		86	51,6				
	21_3	*Aula C*		50	30				
B		CHIRURGIA	1	240	144	156 000,00 €	80 000,00 €	360 000,00 €	596 000,00 €
	20	*Aula De Blasi*		240	144			109 000,00 €	
C		RADIOLOGIA	2	140	84	91 000,00 €	60 000,00 €	140 000,00 €	291 000,00 €
	15_4	*Aula Radiologia*		100	60	55 685,00 €			
	15_4	*Aula*		40	24				
D		CLINICHE MEDICHE	2	480	288	432 000,00 €	120 000,00 €	800 000,00 €	1 352 000,00 €
	12_1	*Aula inferiore*		240	144				
	12_2	*Aula superiore*		240	144				
E		PEDIATRIA	2	130	78	114 500,00 €	40 000,00 €	215 000,00 €	369 500,00 €
	7_1	*Aula Vecchio*		100	60			8 600,00 €	
	7_2	*Aula B*		30	18				
F		ISTITUTI BIOLOGICI	4	735	441	477 750,00 €	80 000,00 €	1 562 500,00 €	2 120 250,00 €
	31_1	*Aula Mitolo*		165	99				
	31_2	*Aula Sangiorgi*		200	120				
	31_3	*Aula Solarino*		195	117				
	31_4	*Aula Farmacologia*		175	105				
G		AULA MAGNA	1	380	228		160 000,00 €		160 000,00 €
	15_3	*Aula De Benedictis*		380	228		156 436,00 €		
		TOTALE	14	1923		1 398 888,13 €	498 368,00 €	3 091 478,71 €	5 148 734,84 €

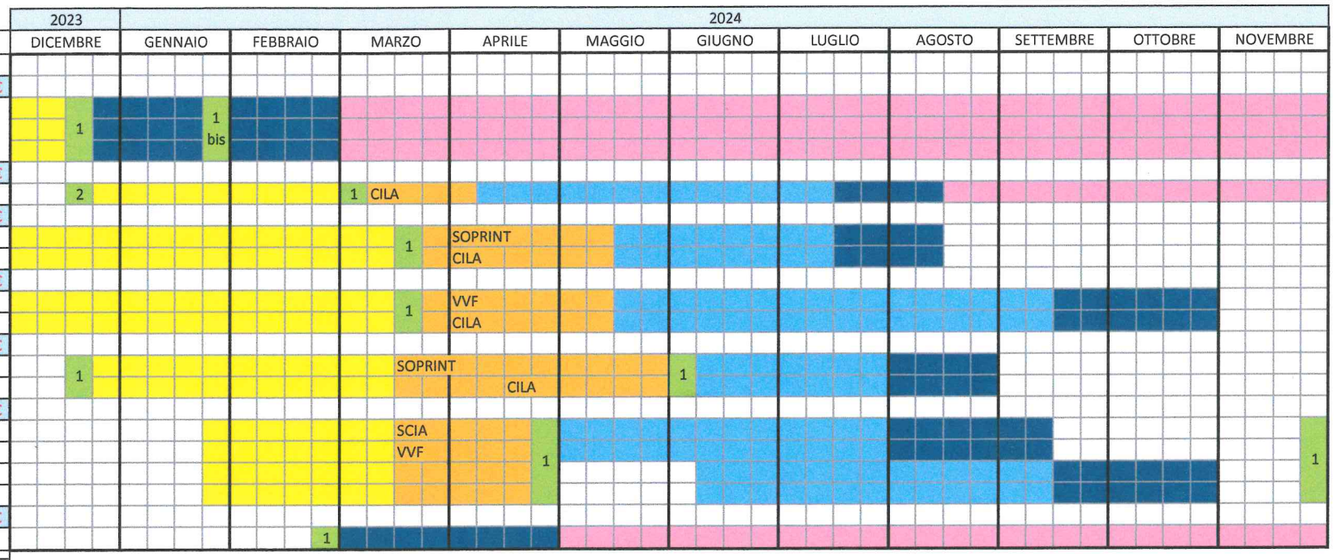

LEGENDA

CILA	Autorizzazione comunale
SCIA	Autorizzazione comunale 30 gg prima inizio dei lavori
VVF	Parere dei Vigili del Fuoco
SOPRINT	Parere della Soprintendenza

Progetto
Autorizzazioni
Ordine Lavori
Esecuzione Lavori
Forniture
Aule Disponibili

Tmax = 0,6 x Np

| | | | | | |
